CRONOGRAMA DE MONTAGEM

NATAL DO BEM - 1ª Etapa - CCON
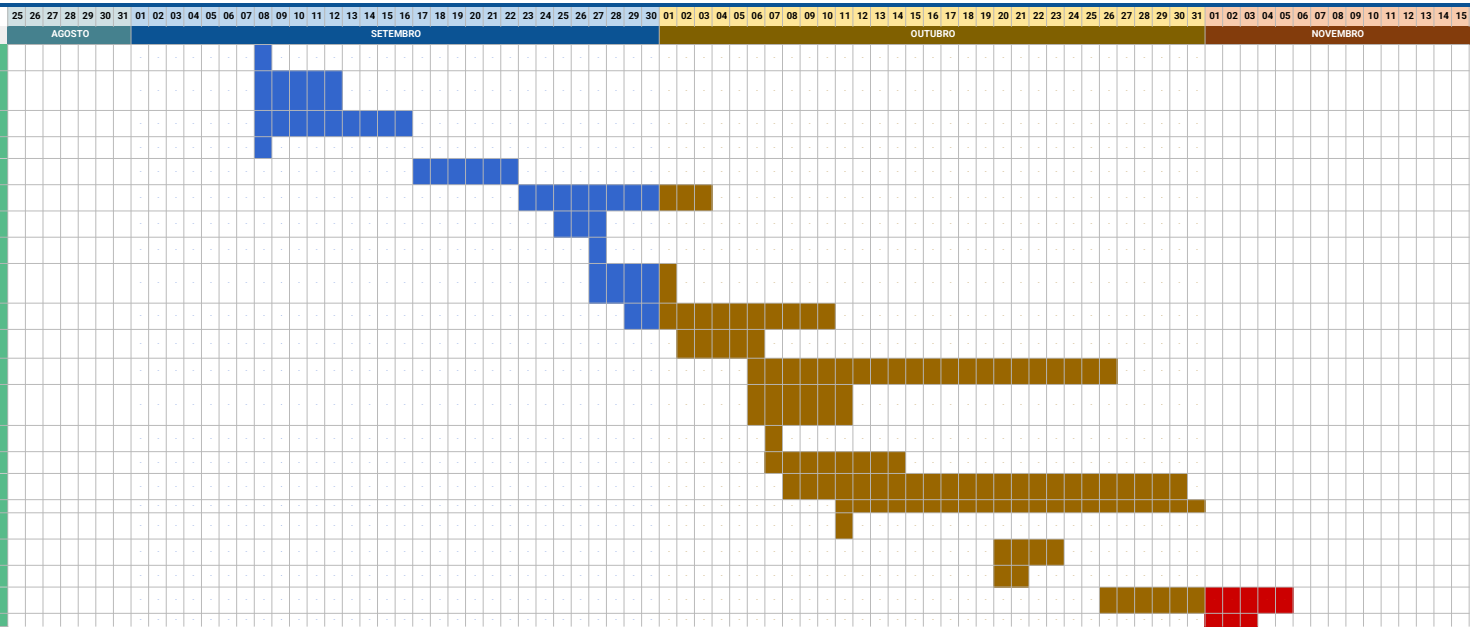
Ord.	Espaço	ATIVIDADE	CONTRATO	DATA DE INÍCIO	DATA FIM	DURAÇÃO	PCT OF TASK COMPLETE
5.5	Vila Gastr.	Receber materiais para montagem das tendas	Tendas	8/9	8/9	1	0%
5.6	Vila Gastr.	Fixar base das sapatas para montagem das tendas (Vila Gastronômica)	Tendas	8/9	12/9	5	0%
5.7	Vila Gastr.	Montar estruturas da tenda (vila gastronômica e brinquedos)	Tendas	8/9	16/9	9	0%
26.12	Outras	Instalar guaritas para os seguranças do evento	Tendas	8/9	8/9	1	0%
5.8	Vila Gastr.	Colocar lonas na tenda - Vila Gastronômica e brinquedos	Tendas	17/9	22/9	6	0%
5.21	Vila Gastr.	Instalar piso elevado (madeira) - Faixa das Casinhas	Tendas	23/9	3/10	10	0%
3.9	Museu	Instalar piso da área da pipoca e algodão doce	Tendas	25/9	27/9	2	0%
8.1	Rampa	Receber material para montagem da tenda	Tendas	27/9	27/9	1	0%
8.2	Rampa	Montar estruturas da tenda (rampa de acesso e área dos containers de banheiro)	Tendas	27/9	1/10	5	0%
5.22	Vila Gastr.	Instalar chapeado sobre piso elevado - Faixa das Casinhas	Tendas	29/9	10/10	11	0%
8.3	Rampa	Instalar lonas transparentes das tendas na rampa de acesso e banheiros	Tendas	2/10	6/10	5	0%
5.23	Vila Gastr.	Instalar piso elevado (madeira) - Demais áreas	Tendas	6/10	26/10	20	0%
8.4	Rampa	Montar piso da tenda cristal	Tendas	6/10	11/10	5	0%
11.1	PM - externo	Receber material para montagem da tenda	Tendas	7/10	7/10	1	0%
11.2	PM - externo	Instalar tenda cristal na rampa do Palácio da Música	Tendas	7/10	14/10	5	0%
5.24	Vila Gastr.	Instalar chapeado sobre piso elevado - Demais áreas	Tendas	8/10	30/10	22	0%
5.30	Vila Gastr.	Instalar piso bus - demais áreas	Tendas	11/10	31/10	20	0%
8.11	Rampa	Instalar fitas antiderrapantes na rampa de acesso	Tendas	11/10	11/10	1	0%
3.18	Museu	Instalar testeiras para barrar o vento	Tendas	20/10	23/10	4	0%
11.13	PM - externo	Instalar fitas antiderrapantes na escadaria do Palácio da Música	Tendas	20/10	21/10	1	0%
5.29	Vila Gastr.	Instalar piso bus - interno Casinhas	Tendas	26/10	5/11	10	0%
26.20	Outras	Montar tendas para CBM e PM	Tendas	1/11	3/11	2	0%
